

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования  
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра № 5

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления

проф., д.т.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

Е.А. Фролова

(инициалы, фамилия)



(подпись)

22.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ


«Управление инновационными программами»

(Наименование дисциплины)

Код направления подготовки/ специальности	27.03.02
Наименование направления подготовки/ специальности	Управление качеством
Наименование направленности	Управление качеством в производственно- технологических системах
Форма обучения	очная

Лист согласования рабочей программы дисциплины


Программу составил (а)

<u>Доц., к.т.н., доц</u> (должность, уч. степень, звание)	 (подпись, дата 15.06.2023)	<u>В.В.Курлов</u> (инициалы, фамилия)
--	---	--


Программа одобрена на заседании кафедры № 5

15.06.2023 г, протокол № 01-06/2023


Заведующий кафедрой № 5

<u>д.т.н., доц.</u> (уч. степень, звание)	 (подпись, дата 15.06.2023)	<u>Е.А. Фролова</u> (инициалы, фамилия)
--	--	--

Ответственный за ОП ВО 27.03.02(01)

<u>проф., д.т.н., доц.</u> (должность, уч. степень, звание)	 (подпись, дата 15.06.2023)	<u>Е.А. Фролова</u> (инициалы, фамилия)
--	---	--

Заместитель директора института ФПТИ по методической работе

<u>доц., к.ф.-м.н.</u> (должность, уч. степень, звание)	 (подпись, дата 15.06.2023)	<u>Ю.А. Новикова</u> (инициалы, фамилия)
--	---	---

## Аннотация

Дисциплина «Управление инновационными программами» входит в образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 27.03.02 «Управление качеством» направленности «Управление качеством в производственно-технологических системах». Дисциплина реализуется кафедрой «№5».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-11 «Способен осуществлять контроль реализации плана мероприятий по повышению качества управления человеческими ресурсами»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением программами в различных отраслях, обеспечивая достижение определенных результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников инновационной программы.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Язык обучения по дисциплине «русский»

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

### 1.1. Цели преподавания дисциплины

Дисциплина «Управление инновационными программами» предназначена для формирования у студентов комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих участвовать в управлении программами в различных отраслях, обеспечивая достижение определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников инновационной программы.

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональные компетенции	ПК-11 Способен осуществлять контроль реализации плана мероприятий по повышению качества управления человеческими ресурсами	ПК-11.3.1 знать основы методов управления качеством при управлении ресурсами, в том числе методологию бенчмаркинга ПК-11.У.1 уметь применять методы квалитетического анализа при управлении ресурсами организации ПК-11.В.1 владеть навыками контроля реализации плана мероприятий по повышению качества управления человеческими ресурсами

## 2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- «Информатика»,
- «Информационное обеспечение проектной деятельности».

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и могут использоваться при прохождении производственной преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной работы.

## 3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№8
1	2	3
<b>Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)</b>	4/ 144	4/ 144

<b>Из них часов практической подготовки</b>	10	10
<b>Аудиторные занятия, всего час.</b>	30	30
в том числе:		
лекции (Л), (час)	20	20
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	10	10
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)	27	27
<b>Самостоятельная работа, всего (час)</b>	87	87
<b>Вид промежуточной аттестации:</b> зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Экз.	Экз.

Примечание: \*\* кандидатский экзамен

#### 4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
<b>Семестр 8</b>					
Раздел 1. Программа проектов. Объединение проектов в инновационную программу Тема 1.1. Сущность инновационных программ, основные понятия и определения Тема 1.2. Объединение проектов в инновационную программу	4	4			16
Раздел 2. Платформы инновационной программы как главный объект управления Тема 2.1. Понятие платформы программы и основные этапы управления инновационной программой Тема 2.2. Связь между управлением инновационными программами, проектным менеджментом и управлением сегментами Тема 2.3. Формирование общей концепции управления инновационными программами	4	4			16
Раздел 3 Платформа оценки. Целостная миссия инновационной программы Тема 3.1. Платформа оценки и целостная миссия инновационной программы Тема 3.2. Масштабирование ценностей. Сбалансированные показатели полной ценности Тема 3.3. Объединение интеллектуальных ресурсов. Архитектура инновационной программы	4	4			20
Раздел 4. Управление профилированием Тема 4.1. Понятие управления профилированием и определение миссии инновационной программы Тема 4.2. Анализ контекста. Цепочка целей и задач Тема 4.3. Ценность сценариев, анализ осуществимости и имитационное моделирование	4	4			20

Раздел 5. Управление стратегией инновационной программы Тема 5.1. Управление стратегией и целями инновационной программы. Тема 5.2. Управление задачами и показателями инновационной программы. Тема 5.3. Управление ресурсами программы и рисками инновационной программы	4	4			15
Итого в семестре:	20	10			87
Итого	20	10	0	0	87

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

#### 4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
1	Сущность инновационных программ, основные понятия и определения – демонстрация слайдов
1	Объединение проектов в инновационную программу – демонстрация слайдов
2	Понятие платформы программы и основные этапы управления инновационной программой – демонстрация слайдов
2	Связь между управлением инновационными программами, проектным менеджментом и управлением сегментами – демонстрация слайдов
3	Платформа оценки и целостная миссия инновационной программы – демонстрация слайдов
3	Масштабирование ценностей. Сбалансированные показатели полной ценности – демонстрация слайдов
4	Понятие управления профилированием и определение миссии инновационной программы – демонстрация слайдов
4	Анализ контекста. Цепочка целей и задач – демонстрация слайдов
5	Управление стратегией и целями инновационной программы – демонстрация слайдов
5	Управление задачами и показателями инновационной программы – демонстрация слайдов
5	Управление ресурсами программы и рисками инновационной программы – демонстрация слайдов

#### 4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 8					
1	Объединение	Решение	2	1	1

	проектов в инновационную программу	ситуационных задач			
2	Формирование общей концепции управления инновационными программами	Решение ситуационных задач	1	0,5	2
3	Объединение интеллектуальных ресурсов. Архитектура инновационной программы	Решение ситуационных задач	2	1	3
4	Ценность сценариев, анализ осуществимости и имитационное моделирование	Решение ситуационных задач	2	1	4
5	Управление задачами и показателями инновационной программы.	Решение ситуационных задач	1	0,5	5
6	Управление ресурсами программы и рисками инновационной программы	Решение ситуационных задач	2	1	5
Всего			10		

#### 4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
Всего				

#### 4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

#### 4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 8, час
1	2	3

Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	36	36
Курсовое проектирование (КП, КР)		
Расчетно-графические задания (РГЗ)	14	14
Выполнение реферата (Р)		
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	17	17
Домашнее задание (ДЗ)		
Контрольные работы заочников (КРЗ)		
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	20	20
Всего:	87	87

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
[330Т 81]	Туккель, И. Л. Управление инновационными проектами [Текст] : учебник для вузов / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин. - СПб. : БХВ - Петербург, 2019. - 396 с.	ОФЛ - 10
[330 К 85]	Методологические вопросы управления процессами реализации инновационно-инвестиционных проектов: монография/ Э. И. Крылов, В. М. Власова, Г. Ю. Пешкова; С.-Петербург. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб.: ГОУ ВПО "СПбГУАП", 2011. - 252 с.	СО – 49, ЛС - 103
[005.5:378 М 54 005]	Методы и инструменты управления качеством проектов: монография/ Ю. А. Антохина [и др.]; С.-Петербург. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб.: ГОУ ВПО "СПбГУАП", 2012. - 304 с.	СО - 75

7. Перечень электронных образовательных ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
-----------	--------------



<a href="http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146">http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391146</a>	Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2019. - 256 с.
---	--

## 8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

## 9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1	Мультимедийная лекционная аудитория	БМ 23-22

## 10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену; Экзаменационные билеты; Задачи; Тесты.

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал;</li> <li>– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;</li> <li>– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления;</li> <li>– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;</li> <li>– делает выводы и обобщения;</li> <li>– свободно владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;</li> <li>– не допускает существенных неточностей;</li> <li>– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления;</li> <li>– аргументирует научные положения;</li> <li>– делает выводы и обобщения;</li> <li>– владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы;</li> <li>– допускает несущественные ошибки и неточности;</li> <li>– испытывает затруднения в практическом применении знаний направления;</li> <li>– слабо аргументирует научные положения;</li> <li>– затрудняется в формулировании выводов и обобщений;</li> <li>– частично владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обучающийся не усвоил значительной части программного материала;</li> <li>– допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении;</li> <li>– испытывает трудности в практическом применении знаний;</li> <li>– не может аргументировать научные положения;</li> <li>– не формулирует выводов и обобщений.</li> </ul>

### 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
1.	Сущность инновационных программ.	ПК-11.3.1
2.	Основные понятия в управлении программами.	ПК-11.У.1
3.	Программа как объект управления. Классификация и характеристики программ.	ПК-11.В.1
4.	Классификация и характеристики программ.	ПК-11.3.1
5.	Участники программы.	ПК-11.У.1
6.	Процесс управления программой и организационная структура.	ПК-11.В.1
7.	Объединение проектов в программу.	ПК-11.У.1
8.	Принципы объединения проектов в программу.	ПК-11.В.1
9.	Понятие платформы программы.	ПК-11.У.1
10.	Основные шаги управления программой.	ПК-11.В.1
11.	Связь между управлением программами, проектным менеджментом и управлением сегментами.	ПК-11.У.1

12.	Формирование «общей точки зрения» на управление программами.	ПК-11.В.1
13.	Методы и техника управления инновационными программами.	ПК-11.В.1
14.	Платформа оценки.	ПК-11.У.1
15.	Целостная миссия программы.	ПК-11.В.1
16.	Взаимосвязь целостной миссии программы и ее видения.	ПК-11.У.1
17.	Масштабирование ценностей.	ПК-11.В.1
18.	Сбалансированные показатели полной ценности.	ПК-11.У.1
19.	Объединение интеллектуальных ресурсов.	ПК-11.В.1
20.	Архитектура программы.	ПК-11.3.1
21.	Понятие управления профилированием.	ПК-11.У.1
22.	Определение миссии программы.	ПК-11.В.1
23.	Анализ контекста.	ПК-11.3.1
24.	Цепочка целей и задач.	ПК-11.У.1
25.	Сотрудничество-интересы.	ПК-11.В.1
26.	Ценность сценариев, анализ осуществимости и имитационное моделирование.	ПК-11.У.1
27.	Управление стратегией программы.	ПК-11.В.1
28.	Управление целями программы.	ПК-11.У.1
29.	Управление задачами и показателями программы.	ПК-11.В.1
30.	Взаимодействие между процедурами управления.	ПК-11.У.1
31.	Управление ресурсами программы.	ПК-11.В.1
32.	Управление рисками программы.	ПК-11.В.1

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.  
Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
1.	Сущность инновационных программ.	ПК-11.3.1
2.	Основные понятия в управлении программами.	ПК-11.У.1
3.	Программа как объект управления. Классификация и характеристики программ.	ПК-11.В.1
4.	Классификация и характеристики программ.	ПК-11.3.1
5.	Участники программы.	ПК-11.У.1
6.	Процесс управления программой и организационная структура.	ПК-11.В.1
7.	Объединение проектов в программу.	ПК-11.У.1
8.	Принципы объединения проектов в программу.	ПК-11.В.1
9.	Понятие платформы программы.	ПК-11.У.1
10.	Основные шаги управления программой.	ПК-11.В.1
11.	Связь между управлением программами, проектным менеджментом и управлением сегментами.	ПК-11.У.1
12.	Формирование «общей точки зрения» на управление программами.	ПК-11.В.1
13.	Методы и техника управления инновационными программами.	ПК-11.В.1
14.	Платформа оценки.	ПК-11.У.1
15.	Целостная миссия программы.	ПК-11.В.1
16.	Взаимосвязь целостной миссии программы и ее видения.	ПК-11.У.1
17.	Масштабирование ценностей.	ПК-11.В.1
18.	Сбалансированные показатели полной ценности.	ПК-11.У.1

19.	Объединение интеллектуальных ресурсов.	ПК-11.В.1
20.	Архитектура программы.	ПК-11.3.1
21.	Понятие управления профилированием.	ПК-11.У.1
22.	Определение миссии программы.	ПК-11.В.1
23.	Анализ контекста.	ПК-11.3.1
24.	Цепочка целей и задач.	ПК-11.У.1
25.	Сотрудничество-интересы.	ПК-11.В.1
26.	Ценность сценариев, анализ осуществимости и имитационное моделирование.	ПК-11.У.1
27.	Управление стратегией программы.	ПК-11.В.1
28.	Управление целями программы.	ПК-11.У.1
29.	Управление задачами и показателями программы.	ПК-11.В.1
30.	Взаимодействие между процедурами управления.	ПК-11.У.1
31.	Управление ресурсами программы.	ПК-11.В.1
32.	Управление рисками программы.	ПК-11.В.1

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
	Учебным планом не предусмотрено

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора
1.	<p><b>Проект это</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной предметной области с установленными требованиями к качеству результатов, с возможными ограничениями расходования средств и ресурсов и со специфической организацией</li> <li>○ уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение заранее определённого <u>результата (цели)</u>, создание определённого, уникального <u>продукта</u> или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска</li> <li>○ инвестиционная целенаправленная деятельность, предусматривающая вложение определённого количества ресурсов и направленная на получение запланированного результата и достижения определённых целей в обусловленные сроки</li> <li>○ процесс перехода из исходного в конечное состояние (результат) при наличии ряда ограничений по времени и ресурсам</li> </ul>	ПК-11.3.1
2.	<p><b>Жизненный цикл проекта включает следующие фазы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ обучение, организация, выполнение, ввод в действие, сопровождение</li> <li>○ инициация, планирование, выполнение, контроль и мониторинг, завершение</li> </ul>	ПК-11.У.1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ планирование, эксплуатация, подготовка кадров, подготовка документации, сдача в эксплуатацию</li> <li>○ инициация, назначение руководителей, разработка плана, организация работ, контроль</li> </ul>	
3.	<p><b>Управление проектами это</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ методология прогнозирования и предупреждения возникновения риска, принятия мер по его снижению (предотвращению) и распределению возможного ущерба между участниками проекта</li> <li>○ методология организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей путем применения современных методов, техники и технологий управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта</li> <li>○ совокупность методов <u>воздействия субъекта</u> управления, направленная на достижение <u>цели</u> (задачи, идеи) с учетом существующих правил и ограничений по времени и ресурсам</li> <li>○ область <u>деятельности</u>, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели при балансировании между объемом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, <u>качеством</u> и <u>рисками</u> в рамках некоторых проектов</li> </ul>	ПК-11.В.1
4.	<p><b>Работа применительно к управлению проектами это</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ физическая величина, зависящая от векторов силы и перемещения</li> <li>○ процесс, требующий затрат времени и ресурсов</li> <li>○ деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей других людей</li> <li>○ деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц</li> </ul>	ПК-11.3.1
5.	<p><b>К основным параметрам сетевой модели относятся</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ номер события, критический путь, резерв, длительность проекта</li> <li>○ ранний срок наступления события, поздний срок наступления события, вероятность риска, стоимость работ</li> <li>○ номер события, ранний срок наступления события, поздний срок наступления события, резерв</li> <li>○ общий временной резерв, свободный временной резерв, длительность критического пути, затраты ресурсов</li> </ul>	ПК-11.У.1
6.	<p><b>Фактическая длительность отдельной работы, являющейся случайной величиной с нормальным законом распределения определяется:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ по формуле <math>t_{нв} = \frac{t_{оп} + 4t_{ож} + t_{пс}}{6}</math></li> <li>○ методом экспертного опроса</li> <li>○ как среднеарифметическое от оптимистической, ожидаемой и пессимистической длительностей</li> <li>○ руководителем проекта</li> </ul>	ПК-11.В.1
7.	<p><b>Ранний срок наступления события это</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ время начала исходного события проекта</li> <li>○ время начала завершающего события проекта</li> <li>○ допустимый момент наступления события, при котором еще возможно выполнение всех последующих работ без превышения срока выполнения всего проекта</li> </ul>	ПК-11.У.1



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ранний из возможных моментов наступления события, определяемый временем выполнения всех предшествующих этому событию работ</li> </ul>	
8.	<p><b>Поздний срок наступления события это</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ время начала исходного события проекта</li> <li>○ время начала завершающего события проекта</li> <li>○ допустимый момент наступления события, при котором еще возможно выполнение всех последующих работ без превышения срока выполнения всего проекта</li> <li>○ ранний из возможных моментов наступления события, определяемый временем выполнения всех предшествующих этому событию работ</li> </ul>	ПК-11.В.1
9.	<p><b>Матрица РАЗУ означает</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ матрица разделения административных задач управления</li> <li>○ матрица распределения автоматизированных задач управления</li> <li>○ матрица решения административных задач управления</li> <li>○ матрица ранжированных административных задач управления</li> </ul>	ПК-11.У.1
10.	<p><b>Матрица РАЗУ предназначена для</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ разделения административных задач управления и контроля выполнения проекта</li> <li>○ распределения обязанностей между участниками проекта</li> <li>○ четкого разделения должностных обязанностей и ответственности в процессе управления проектом</li> </ul> <p>определения важности и очередности выполнения задач проекта</p>	ПК-11.В.1
11.	<p><b>Под инновационным проектом понимают</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ новую последовательность выполнения структуры работ, при ограничении на ресурсы и направленную на достижение поставленной цели</li> <li>○ инновационный процесс создания структуры работ, ресурсов и их назначения</li> <li>○ инновационная деятельность команды проекта в профессиональной области, направленная на достижение поставленной цели</li> </ul> <p>частную форму организации и управления <u>инновационным процессом</u> (инновационной деятельностью), результатом которой служит конкретная <u>инновация</u> (инновационный продукт)</p>	ПК-11.У.1
12.	<p><b>В основе управления проектами лежит</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ треугольник проекта</li> <li>○ сфера проекта</li> <li>○ призма проекта</li> <li>○ структура проекта</li> </ul>	ПК-11.В.1
13.	<p><b>При определении опорных дат проекта можно задать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ планирование от даты начала проекта</li> <li>○ планирование от даты окончания проекта</li> <li>○ планирование от даты начала и окончания проекта одновременно</li> <li>○ планирование по мере освобождения ресурсов</li> </ul>	ПК-11.В.1
14.	<p><b>Опорная дата проекта определяется</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ только после окончания работы над проектом</li> <li>○ только на начальном этапе</li> <li>○ на начальном этапе и в процессе работы над проектом</li> <li>○ только после сохранения базового плана проекта</li> </ul>	ПК-11.У.1
15.	<p><b>При планировании от даты начала проекта все задачи начинаются</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ как можно позже</li> </ul>	ПК-11.В.1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ как можно раньше</li> <li>○ с учетом наличия ресурсов</li> <li>○ с учетом структуры проекта</li> </ul>	
16.	<p><b>При изменении рабочего времени существует возможность выбрать тип календаря</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ стандартный</li> <li>○ 24 часовой</li> <li>○ ночная смена</li> <li>○ 12 часовой</li> </ul>	ПК-11.У.1
17.	<p><b>Создание перечня работ с оценкой их продолжительности осуществляется в представлении</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ диаграмма Ганта</li> <li>○ диаграмма Ганта с отслеживанием</li> <li>○ лист ресурсов</li> <li>○ использование задач</li> </ul>	ПК-11.В.1
18.	<p><b>Количество типов работ при организации иерархической структуры проекта равно</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4</li> <li>○ 6</li> <li>○ 8</li> <li>○ 5</li> </ul>	ПК-11.У.1
19.	<p><b>Организация иерархической структуры работ проекта включает определение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ типа работы и установление связей между ними</li> <li>○ основных этапов проекта и их длительности</li> <li>○ определение связей между объемлющими работами и длительности проекта</li> <li>○ критических работ проекта</li> </ul>	ПК-11.В.1
20.	<p><b>Укажите не существующие типы работы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ комплексные</li> <li>○ повторяющиеся</li> <li>○ веха</li> <li>○ элементарные</li> </ul>	ПК-11.3.1
21.	<p><b>Длительность объемлющей (суммарной) задачи</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ рассчитывается автоматически</li> <li>○ задается вручную</li> <li>○ определяется как сумма длительностей входящих задач</li> <li>○ равна максимальной по длительности входящей задачи</li> </ul>	ПК-11.У.1
22.	<p><b>Укажите формы связи работ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ пуск-остановка</li> <li>○ окончание-начало</li> <li>○ завершение-начало</li> <li>○ начало-начало</li> </ul>	ПК-11.В.1
23.	<p><b>К правильным типам временных ограничений относятся ограничения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ как можно раньше (КМР)</li> <li>○ окончание не ранее (ОНР)</li> <li>○ завершить в интервале (ЗВИ)</li> <li>○ начать не ранее (НРН)</li> </ul>	ПК-11.3.1
24.	<p><b>Укажите тип связи между задачей 1 и задачей 2</b></p>	ПК-11.У.1

	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Название задачи</th> <th colspan="4">07 Ноя '11</th> <th colspan="4">14 Ноя '11</th> <th colspan="4">21 Ноя '11</th> </tr> <tr> <th>П</th><th>В</th><th>С</th><th>Ч</th> <th>П</th><th>В</th><th>С</th><th>Ч</th> <th>П</th><th>В</th><th>С</th><th>Ч</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Задача 1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Задача 2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ НН + 2 дней</li> <li>○ ОО – 4 дней</li> <li>○ ОН + 2 дней</li> <li>○ НН + 4 дней</li> </ul>		Название задачи	07 Ноя '11				14 Ноя '11				21 Ноя '11				П	В	С	Ч	П	В	С	Ч	П	В	С	Ч	1	Задача 1													2	Задача 2																																																																																																																																								
	Название задачи			07 Ноя '11				14 Ноя '11				21 Ноя '11																																																																																																																																																																							
		П	В	С	Ч	П	В	С	Ч	П	В	С	Ч																																																																																																																																																																						
1	Задача 1																																																																																																																																																																																		
2	Задача 2																																																																																																																																																																																		
25.	<p><b>Установление связи между задачей 1 и задачей 2</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Название задачи</th> <th colspan="4">07 Ноя '11</th> <th colspan="4">14 Ноя '11</th> <th colspan="4">21 Ноя '11</th> </tr> <tr> <th>П</th><th>В</th><th>С</th><th>Ч</th> <th>П</th><th>В</th><th>С</th><th>Ч</th> <th>П</th><th>В</th><th>С</th><th>Ч</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Задача 1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Задача 2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ осуществимо, если удалить строку с задачей 2 и ввести ее заново</li> <li>○ осуществимо обычным способом</li> <li>○ не осуществимо в любом случае</li> <li>○ осуществимо, если задачи вывести на один уровень иерархии</li> </ul>		Название задачи	07 Ноя '11				14 Ноя '11				21 Ноя '11				П	В	С	Ч	П	В	С	Ч	П	В	С	Ч	1	Задача 1													2	Задача 2													ПК-11.В.1																																																																																																																											
	Название задачи			07 Ноя '11				14 Ноя '11				21 Ноя '11																																																																																																																																																																							
		П	В	С	Ч	П	В	С	Ч	П	В	С	Ч																																																																																																																																																																						
1	Задача 1																																																																																																																																																																																		
2	Задача 2																																																																																																																																																																																		
26.	<p><b>Доступность трудового ресурса</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ процент рабочего свободного для проекта времени</li> <li>○ количество рабочего времени, в течение которого ресурс будет занят выполнением задач проекта</li> <li>○ количество ресурсов (людей) в процентах</li> <li>○ количество свободного времени ресурса в часах</li> </ul>	ПК-11.У.1																																																																																																																																																																																	
27.	<p><b>Зависимость между трудозатратами, длительностью и ресурсами проекта определяется формулой</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Трудозатраты = Длительность / Единицы ресурсов</li> <li>○ Трудозатраты = Длительность + Единицы ресурсов</li> <li>○ Трудозатраты = Длительность * Единицы ресурсов</li> <li>○ Трудозатраты = Длительность – Единицы ресурсов</li> </ul>	ПК-11.В.1																																																																																																																																																																																	
28.	<p><b>Информация о том, что трудовой ресурс участвует в проекте половину рабочего дня, задается</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ при назначении ресурса на задачу</li> <li>○ в столбце <i>макс. единиц</i> представления <i>лист ресурсов</i></li> <li>○ в календаре трудового ресурса</li> <li>○ в длительности задачи</li> </ul>	ПК-11.У.1																																																																																																																																																																																	
29.	<p><b>Представление график ресурсов предназначено для</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ анализа распределения ресурсов и затрат</li> <li>○ построения графика участия ресурсов в проекте</li> <li>○ определения недостающих ресурсов</li> <li>○ выравнивания наружки</li> </ul>	ПК-11.В.1																																																																																																																																																																																	
30.	<p><b>Проект длится</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Название задачи</th> <th rowspan="2">Длительность</th> <th rowspan="2">Начало</th> <th rowspan="2">Окончание</th> <th colspan="4">07 Ноя '11</th> <th colspan="4">14 Ноя '11</th> <th colspan="4">21 Ноя '11</th> <th colspan="4">28 Ноя '11</th> </tr> <tr> <th>С</th><th>Ч</th><th>П</th><th>В</th> <th>С</th><th>Ч</th><th>П</th><th>В</th> <th>С</th><th>Ч</th><th>П</th><th>В</th> <th>С</th><th>Ч</th><th>П</th><th>В</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Задача 1</td> <td>3 дней</td> <td>Чт 10.11.11</td> <td>Пн 14.11.11</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Задача 2</td> <td>5 дней</td> <td>Вт 15.11.11</td> <td>Пн 21.11.11</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Задача 3</td> <td>6 дней</td> <td>Вт 15.11.11</td> <td>Вт 22.11.11</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Задача 4</td> <td>4 дней</td> <td>Вт 15.11.11</td> <td>Пт 18.11.11</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Задача 5</td> <td>7 дней</td> <td>Пн 21.11.11</td> <td>Вт 29.11.11</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Задача 6</td> <td>3 дней</td> <td>Ср 23.11.11</td> <td>Пт 25.11.11</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Задача 7</td> <td>8 дней</td> <td>Вт 15.11.11</td> <td>Чт 24.11.11</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	07 Ноя '11				14 Ноя '11				21 Ноя '11				28 Ноя '11				С	Ч	П	В	С	Ч	П	В	С	Ч	П	В	С	Ч	П	В	1	Задача 1	3 дней	Чт 10.11.11	Пн 14.11.11																2	Задача 2	5 дней	Вт 15.11.11	Пн 21.11.11																3	Задача 3	6 дней	Вт 15.11.11	Вт 22.11.11																4	Задача 4	4 дней	Вт 15.11.11	Пт 18.11.11																5	Задача 5	7 дней	Пн 21.11.11	Вт 29.11.11																6	Задача 6	3 дней	Ср 23.11.11	Пт 25.11.11																7	Задача 7	8 дней	Вт 15.11.11	Чт 24.11.11																ПК-11.У.1
	Название задачи						Длительность	Начало	Окончание	07 Ноя '11				14 Ноя '11				21 Ноя '11				28 Ноя '11																																																																																																																																																													
		С	Ч	П	В	С				Ч	П	В	С	Ч	П	В	С	Ч	П	В																																																																																																																																																															
1	Задача 1	3 дней	Чт 10.11.11	Пн 14.11.11																																																																																																																																																																															
2	Задача 2	5 дней	Вт 15.11.11	Пн 21.11.11																																																																																																																																																																															
3	Задача 3	6 дней	Вт 15.11.11	Вт 22.11.11																																																																																																																																																																															
4	Задача 4	4 дней	Вт 15.11.11	Пт 18.11.11																																																																																																																																																																															
5	Задача 5	7 дней	Пн 21.11.11	Вт 29.11.11																																																																																																																																																																															
6	Задача 6	3 дней	Ср 23.11.11	Пт 25.11.11																																																																																																																																																																															
7	Задача 7	8 дней	Вт 15.11.11	Чт 24.11.11																																																																																																																																																																															



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 14 рабочих дней</li> <li>○ 36 рабочих дней</li> <li>○ 20 календарных дней</li> <li>○ 15 рабочих дней</li> </ul>																												
31.	<p><b>Уменьшить длительность проекта на два дня можно путем сокращения длительностей</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Название задачи</th> <th>Длительность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Проект1</td> <td>14 дней</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Задача 1</td> <td>3 дня</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Задача 2</td> <td>5 дней</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Задача 3</td> <td>6 дней</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Задача 4</td> <td>4 дня</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Задача 5</td> <td>7 дней</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Задача 6</td> <td>3 дня</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Задача 7</td> <td>8 дней</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ задачи 1, или задачи 4, или задачи 5</li> <li>○ задачи 4</li> <li>○ задачи 3</li> <li>○ задачи 7</li> </ul>		Название задачи	Длительность	0	Проект1	14 дней	1	Задача 1	3 дня	2	Задача 2	5 дней	3	Задача 3	6 дней	4	Задача 4	4 дня	5	Задача 5	7 дней	6	Задача 6	3 дня	7	Задача 7	8 дней	ПК-11.В.1
	Название задачи	Длительность																											
0	Проект1	14 дней																											
1	Задача 1	3 дня																											
2	Задача 2	5 дней																											
3	Задача 3	6 дней																											
4	Задача 4	4 дня																											
5	Задача 5	7 дней																											
6	Задача 6	3 дня																											
7	Задача 7	8 дней																											
32.	<p><b>Представление график ресурсов предназначено для</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ анализа распределения ресурсов и затрат</li> <li>○ построения графика участия ресурсов в проекте</li> <li>○ определения недостающих ресурсов</li> <li>○ выравнивания наружки ресурсов</li> </ul>	ПК-11.В.1																											
33.	<p><b>При увеличении единиц ресурсов, назначенных задаче, ее длительность</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ увеличивается</li> <li>○ не изменяется</li> <li>○ изменять единицы ресурсов после назначения нельзя</li> <li>○ уменьшается</li> </ul>	ПК-11.3.1																											
34.	<p><b>Укажите неверный тип планирования задач</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ фиксированная длительность</li> <li>○ фиксированный объем ресурсов</li> <li>○ фиксированное окончание проекта</li> </ul> <p>фиксированные трудозатраты (объем работ)</p>	ПК-11.У.1																											
35.	<p><b>Если при типе планирования фиксированный объем ресурсов изменить объем ресурсов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ изменится длительность</li> <li>○ изменится объем работ</li> <li>○ ничего не изменится</li> <li>○ изменять объем ресурсов при данном типе планирования нельзя</li> </ul>	ПК-11.В.1																											
36.	<p><b>Если при типе планирования фиксированные трудозатраты изменить объем работ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ изменится длительность</li> <li>○ изменится объем ресурсов</li> <li>○ ничего не изменится</li> <li>○ изменять объем работ при данном типе планирования нельзя</li> </ul>	ПК-11.3.1																											
37.	<p><b>Если при типе планирования фиксированная длительность изменить длительность задачи</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ изменится длительность</li> <li>○ изменится объем работ</li> <li>○ ничего не изменится</li> <li>○ изменять длительность при данном типе планирования нельзя</li> </ul>	ПК-11.У.1																											

38.	<p><b>При создании пула проектов преимущество имеет</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ всегда пул проектов</li> <li>○ всегда клиенты пула (проекты)</li> <li>○ всегда первый клиент пула</li> <li>○ конфликт разрешается указанием способа его разрешения</li> </ul>	ПК-11.В.1															
39.	<p><b>Метод PERT это</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Programm, Evaluation and Review Technique</li> <li>○ метод оптимизации нагрузки ресурсов</li> <li>○ метод переоценки, переосмысления программ</li> <li>○ метод определения критических задач проекта</li> </ul>	ПК-11.У.1															
40.	<p><b>Для расчета длительности задачи по методу PERT используются следующие оценки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ оптимистическая, наиболее вероятная и пессимистическая длительности</li> <li>○ отличная, хорошая и плохая длительности</li> <li>○ оптимальная, наиболее вероятная и пессимистическая длительности</li> <li>○ оптимистическая, ожидаемая и пессимистическая длительности</li> </ul>	ПК-11.В.1															
41.	<p><b>Базовый план проекта предназначен для</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ определения отклонений текущих параметров проекта от базовых</li> <li>○ расчета базового бюджета проекта</li> <li>○ принятия решения по целесообразности реализации проекта</li> <li>○ анализа критического пути (задач) проекта</li> </ul>	ПК-11.У.1															
42.	<p><b>Веха это</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ несуществующая задача проекта</li> <li>○ наиболее важная задача проекта</li> <li>○ задача с длительностью ноль</li> <li>○ наименее важная задача проекта</li> </ul>	ПК-11.В.1															
43.	<p><b>На рисунке изображен проект в представлении</b></p> <table border="1" data-bbox="300 1193 850 1384"> <thead> <tr> <th></th> <th>Название задачи</th> <th>Длительность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Задача 1</td> <td>2 дней</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Задача 2</td> <td>3 дней</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Задача 3</td> <td>2 дней</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Задача 4</td> <td>4 дня</td> </tr> </tbody> </table>  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ диаграмма Ганта</li> <li>○ диаграмма Ганта с отслеживанием</li> <li>○ лист ресурсов</li> <li>○ использование задач</li> </ul>		Название задачи	Длительность	1	Задача 1	2 дней	2	Задача 2	3 дней	3	Задача 3	2 дней	4	Задача 4	4 дня	ПК-11.У.1
	Название задачи	Длительность															
1	Задача 1	2 дней															
2	Задача 2	3 дней															
3	Задача 3	2 дней															
4	Задача 4	4 дня															
44.	<p><b>На рисунке изображен проект в представлении</b></p> <table border="1" data-bbox="300 1608 850 1798"> <thead> <tr> <th></th> <th>Название задачи</th> <th>Длительность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Задача 1</td> <td>2 дней</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Задача 2</td> <td>3 дня</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Задача 3</td> <td>2 дня</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Задача 4</td> <td>4 дня</td> </tr> </tbody> </table>  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ диаграмма Ганта</li> <li>○ диаграмма Ганта с отслеживанием</li> <li>○ лист ресурсов</li> <li>○ использование задач</li> </ul>		Название задачи	Длительность	1	Задача 1	2 дней	2	Задача 2	3 дня	3	Задача 3	2 дня	4	Задача 4	4 дня	ПК-11.В.1
	Название задачи	Длительность															
1	Задача 1	2 дней															
2	Задача 2	3 дня															
3	Задача 3	2 дня															
4	Задача 4	4 дня															
45.	<p><b>На рисунке изображен проект в представлении</b></p>	ПК-11.В.1															

№	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на исполыз.
1	Мастер 1	Трудовой		М		100%	380,00р./ч	0,00р./ч	0,00р./ч
2	Краска	Материальный	литр	К			250,00р.		0,00р./л

- диаграмма Ганта
- диаграмма Ганта с отслеживанием
- лист ресурсов
- использование задач

46. **На рисунке изображен проект в представлении**

ПК-11.У.1

№	Название задачи	Трудозатраты	Подробности	
			Ч	П
1	Задача 1	16 ч		
	Мастер 1	16 ч		
	Краска	1 литр		
2	Задача 2	24 ч	8ч	8ч
	Мастер 1	24 ч	8ч	8ч
	Краска	1 литр	0,33	0,33
3	Задача 3	16 ч		
	Мастер 1	16 ч		
	Краска	1 литр		
4	Задача 4	32 ч		
	Мастер 1	32 ч		
	Краска	1 литр		

- диаграмма Ганта
- использование ресурсов
- лист ресурсов
- использование задач

47. **На рисунке изображен проект в представлении**

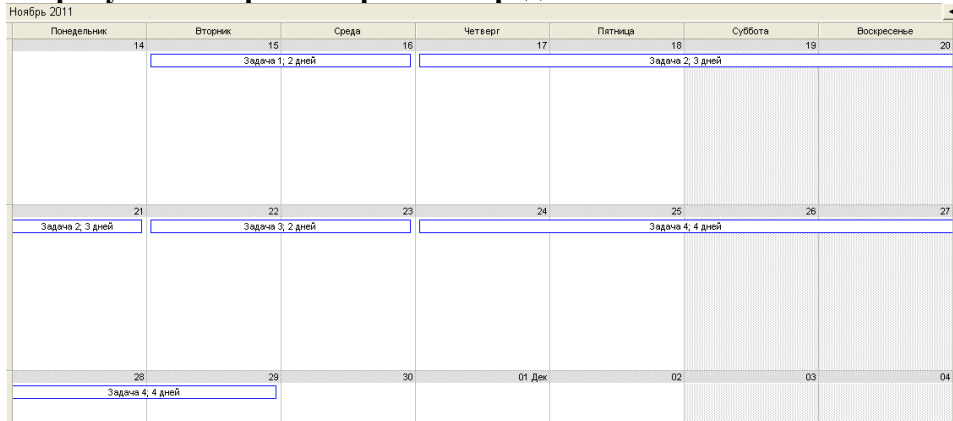
ПК-11.В.1

№	Название ресурса	Трудозатраты	Подробности			
			В	С	Ч	П
1	Мастер 1	88 ч	8ч	8ч	8ч	8ч
	Задача 1	16 ч	8ч	8ч		
	Задача 2	24 ч			8ч	8ч
	Задача 3	16 ч				
	Задача 4	32 ч				
2	Краска	2 литр			0,33	0,33
	Задача 2	1 литр			0,33	0,33
	Задача 4	1 литр				


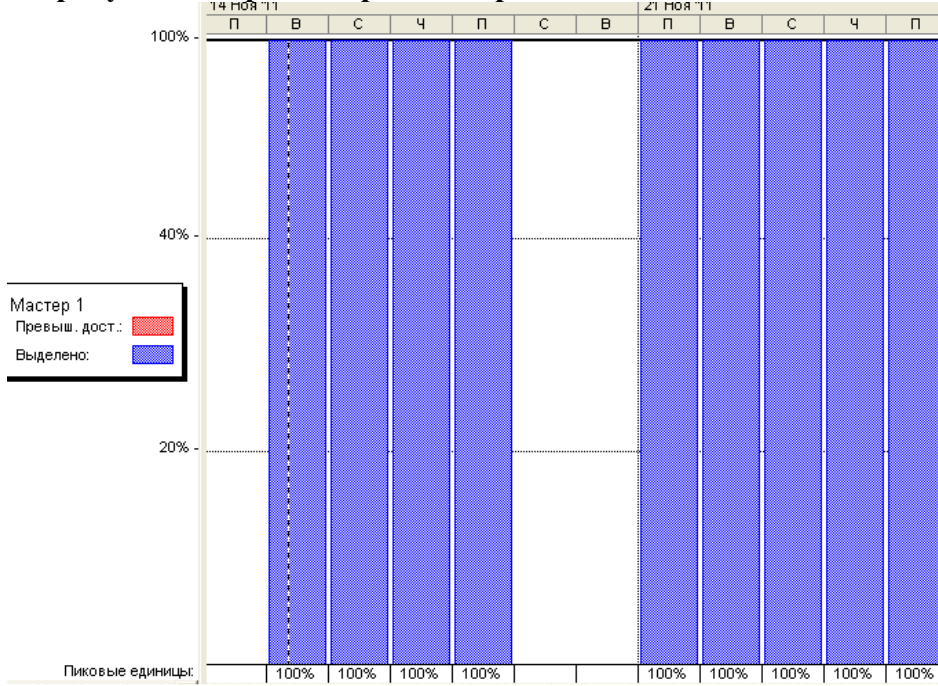
- диаграмма Ганта
- использование ресурсов
- лист ресурсов
- использование задач

48. **На рисунке изображен проект в представлении**

ПК-11.У.1



- диаграмма Ганта
- использование ресурсов
- календарь
- использование задач

49.	<p><b>На рисунке изображен проект в представлении</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> диаграмма Ганта</li> <li><input type="radio"/> использование ресурсов</li> <li><input type="radio"/> использование задач</li> <li><input type="radio"/> сетевой график</li> </ul>	ПК-11.В.1
50.	<p><b>На рисунке изображен проект в представлении</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> график ресурсов</li> <li><input type="radio"/> использование ресурсов</li> <li><input type="radio"/> использование задач</li> <li><input type="radio"/> сетевой график</li> </ul>	ПК-11.У.1
51.	<p><b>В представлении диаграмма Ганта для расчета затрат на проект необходимо</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> ввести формулу</li> <li><input type="radio"/> в представлении Ганта расчет затрат невозможен</li> <li><input type="radio"/> вставить столбец <b>затраты</b></li> <li><input type="radio"/> вставить столбец <b>общие затраты</b></li> </ul>	ПК-11.В.1
52.	<p><b>В представлении диаграмма Ганта с отслеживанием можно указать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> процент выполнения бюджета задачи и проекта</li> <li><input type="radio"/> процент завершения задачи</li> <li><input type="radio"/> процент невыполненных задач</li> <li><input type="radio"/> процент времени выполнения критических задач проекта</li> </ul>	ПК-11.3.1
53.	<p><b>В стандартном календаре проекта рабочий день по умолчанию длится</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 8 ч.</li> <li><input type="radio"/> 7 ч. 40 мин.</li> <li><input type="radio"/> длительность рабочего дня указывается при начале планирования</li> <li><input type="radio"/> 12 ч.</li> </ul>	ПК-11.У.1
54.	<p><b>В столбце Длительность указана длительность задачи 24 ч. При использовании стандартного календаря проекта по умолчанию в представлении диаграмма Ганта отразится длительность</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 6 дней</li> </ul>	ПК-11.В.1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 сутки</li> <li>○ 24 ч.</li> <li>○ 3 дня</li> </ul>	
55.	<p><b>В столбце Длительность указана длительность задачи 48 ач. При использовании стандартного календаря проекта по умолчанию в представлении диаграмма Ганта отразится длительность</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6 дней</li> <li>○ 2 суток</li> <li>○ 48 ач.</li> <li>○ 8 дней</li> </ul>	ПК-11.З.1
56.	<p><b>При изменении длительности задачи после сохранения базового плана проекта изменяются</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ текущие затраты</li> <li>○ базовые затраты</li> <li>○ затраты не меняются</li> <li>○ необходимо заново сохранить базовый план</li> </ul>	ПК-11.У.1
57.	<p><b>При планировании от даты окончания проекта все задачи начинаются</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ как можно раньше</li> <li>○ с учетом структуры проекта</li> <li>○ с учетом наличия ресурсов</li> <li>○ как можно позже</li> </ul>	ПК-11.В.1
58.	<p><b>Имя файла проекта имеет расширение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ pdf</li> <li>○ ppt</li> <li>○ mpp</li> <li>○ bmp</li> </ul>	ПК-11.У.1

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
	Не предусмотрено

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

## 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала.

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходиться к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала:

- сущность инновационных программ, основные понятия в управлении программами;
- классификация и характеристики программ, жизненный цикл и фазы программы, участники программы;
- процесс управления программами и организационная структура программ;
- построение сетевой модели. основные параметры сетевой модели;
- организационные структуры управления программами и общие принципы их построения;
- общая последовательность разработки и создания организационных структур управления программами;
- современные методы и средства организационного моделирования программ;
- особенности и источники инвестирования инновационной сферы, бизнес-планирование инновационных программ;
- формирование инвестиционного замысла (идеи) программы и проектный анализ;
- особенности системы проектного финансирования, преимущества и недостатки;
- оценка экономической эффективности инновационных программ;
- инструментальные средства автоматизации управления программами;
- интегрированные информационные системы поддержки принятия решения;
- классификация программного обеспечения по управлению проектами;
- особенности внедрения информационных систем управления программами;
- возможности Microsoft Project и основные элементы интерфейса, определение опорных дат и настройка календаря инновационной программы;
- создание перечня работ с оценкой их продолжительности и организация иерархической структуры перечня работ.

## 11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

#### Требования к проведению практических занятий

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий является решение разного рода задач, в том числе профессиональных. Практические занятия направлены на формирование у студентов профессиональных и практических умений и навыков, необходимых для управления проектами.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

При выборе содержания и объема практических занятий следует исходить из сложности учебного материала для усвоения, из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место занимает конкретная работа в процессе формирования целостного представления о содержании дисциплины «Управление инновационными программами».

Практическое занятие должно проводиться в учебной аудитории с компьютерами и мультимедийным оборудованием и имеет продолжительность, как правило, не менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения студентами запланированными умениями. Выполнению практических заданий предшествует проверка знаний студентов - их теоретической готовности к выполнению задания.

Практические задания могут носить:

- репродуктивный характер: в этом случае при их выполнении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), порядок выполнения работы, таблицы, выводы, контрольные вопросы, учебная и специальная литература;
- частично-поисковый характер: эти работы отличаются тем, что студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых действий. они должны самостоятельно выбрать необходимые способы выполнения работы по материалам лекций, предыдущих практических занятий, инструктивной, справочной и другой литературы;
- поисковый характер: такие работы характеризуются тем, что студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся теоретические знания.

При планировании практических занятий необходимо находить оптимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности.

На практических занятиях по дисциплине «Управление инновационными программами» могут применяться следующие формы работы:

- фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу;
- групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек (команда проекта);
- индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание.

Структура практических занятий включает: вступление преподавателя, работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, включающая разбор конкретных ситуаций, решение задач, тренировочные упражнения, эксперименты, моделирование и т.д.

Контроль знаний студентов, полученных на практическом занятии, является наиболее ответственной частью занятия, так как определяет степень достижения цели.

### 11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине;
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).

### 11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

В результате текущего контроля по дисциплине студент набирает баллы за следующие виды работы (максимально – 70 баллов):

- посещаемость лекций и практических занятий – 1 балл (итого – 15 баллов);
- выполнение практических работ – 3 балла (итого – 15 баллов);
- защита проекта в два этапа – 15 баллов (итого – 30 баллов);
- активность на занятиях – до 10 баллов.

### 11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:



– экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

– зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено».

– дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся при изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых работ, научно-исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине в форме экзамена.

Подготовка студентов к экзамену включает:

- самостоятельную работу в течение семестра;
- непосредственную подготовку в дни, предшествующие экзамену;
- подготовку к ответу на вопросы, содержащиеся в тесте.

Рекомендации обучающимся.

1. Подготовку к экзамену целесообразно начинать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать.

2. Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при условии достаточной научной и обоснованной аргументации. Наиболее эффективными для подготовки к экзамену учебниками и учебными пособиями являются издания рекомендованные Министерством образования и науки.

3. Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

4. Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.

Для более эффективного понимания программного материала полезно общаться с преподавателем на групповых и индивидуальных консультациях.

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой
